

# Comune di Lucca

Restauro e manutenzione delle  
mura urbane paramenti, muretti, porte e sotterranei.  
Intervento di riapertura della sortita del  
Baluardo San Colombano




Città di Lucca



## Sotterraneo San Colombano

Comune di Lucca, LU

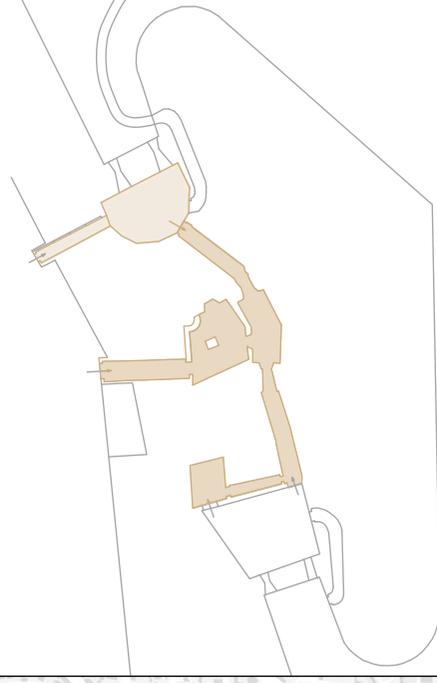

Tavola

# S2

Oggetto  
Cronoprogramma

Scala

Data

Architetto

10/09/2024

Jacopo Croci

PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI CANTIERE

		2024					2025									
		NOVEMBRE	DICEMBRE	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE			
	ATTIV.															
impianto cantiere	1	■	■													
recinzione area	2	■	■	■	■											
montaggio ponteggio facciate casermetta	3		■	■	■											
rifacimento intonaci	4				■	■	■	■								
tinteggiature	5						■	■	■							
restauo portoni smontaggio	7			■	■	■										
restauo portoni rimontaggio	8									■	■					
restauo cancello in ferro smontaggio	9				■	■										
restauo cancello in ferro rimontaggio	10										■	■				
pavimentazione percorso	11								■	■	■	■				
realizzazione di pedana circolare in ferro	12								■	■	■	■				
installazione di pannelli espositivi in corten	13									■	■	■	■			
installazione di grafiche	14											■	■			
installazione di plastico della città	15											■	■			
	16															
impianto elettrico revisione/integrazione linee e quadro	17			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
impianto elettrico installazione nuovi corpi illuminanti	18						■	■	■	■	■	■	■			
PIANIFICAZIONE DEI LAVORI																
INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE																
IMPRESA N°	1	LAVORI EDILI														
IMPRESA N°	2	LAVORI DI VERNICIATURA ESTERNA														
IMPRESA N°	3	LAVORI DI RESTAURO PORTONI-CANCELLI														
IMPRESA N°	4	LAVORI DI ELETTRICISTA														
IMPRESA N°	5	LAVORI DI FORNITURA/INSTALLAZIONE ELEMENTI ESPOSITIVI														
